



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE ALICANTE-ELCHE

Informe ejecutivo

14 de diciembre 2018

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

Declaración de Impacto Ambiental 30/09/2003

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	ALICANTE	ELCHE	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1.291	2.462	3.753
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.291	1.911	3.202
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.291	1.901	3.192
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	1.291	1.734	3.025
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	1.289	1.719	3.008
Total de viviendas con financiación aprobada	1.289	1.718	3.007
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	-	17	17
Total de viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	1.289	1.701	2.990

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:


$$R = \frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 3.007}{\text{Total solicitudes recibidas: } 3.202}$$

93,91% DEL P.A.A. FINALIZADO

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2006-2018)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 3.007

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 2.990

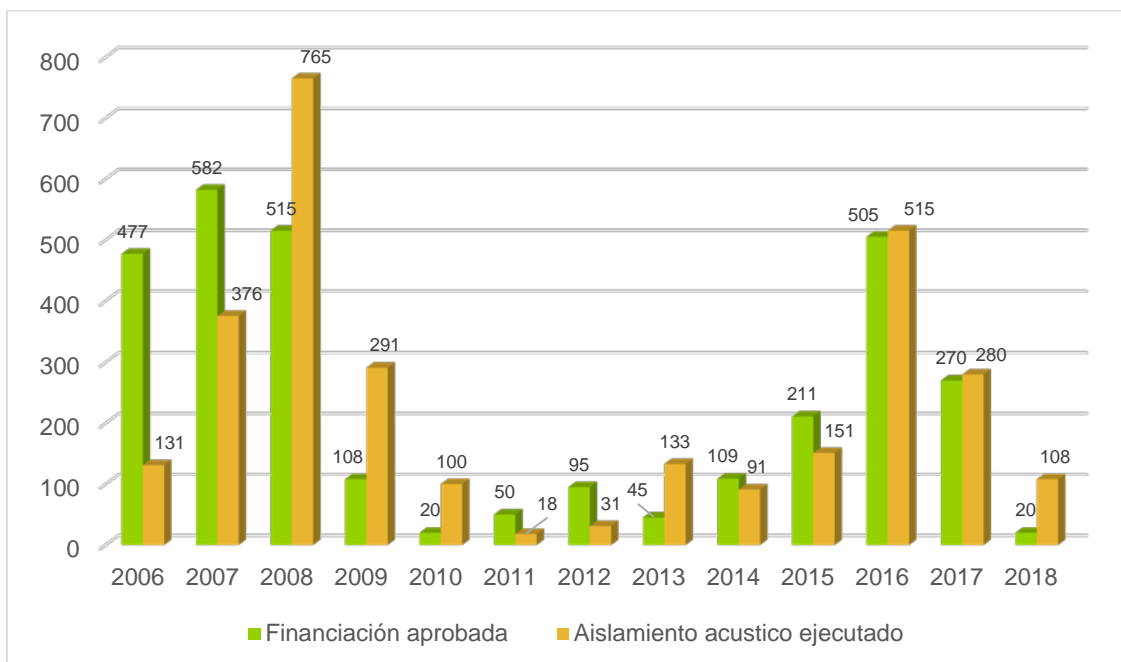

Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2006-2018)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 42,847 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 38,337 Mill. €

