



# PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE PAMPLONA

Informe ejecutivo

29 de abril de 2013

## Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

Declaración de Impacto Ambiental 18/06/07

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Galar	Noaín	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	48	6	54
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	44	5	49
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	44	5	49
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	43	3	46
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	43	3	46
Total de viviendas con financiación aprobada	43	3	46
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	text-align: center;">3	text-align: center;">-	text-align: center;">3
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	text-align: center;">40	text-align: center;">3	text-align: center;">43

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:


$$R = \frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 46}{\text{Total solicitudes recibidas: } 54}$$

**85,18% DEL P.A.A. FINALIZADO**

## Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2010-2013)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 46

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 43

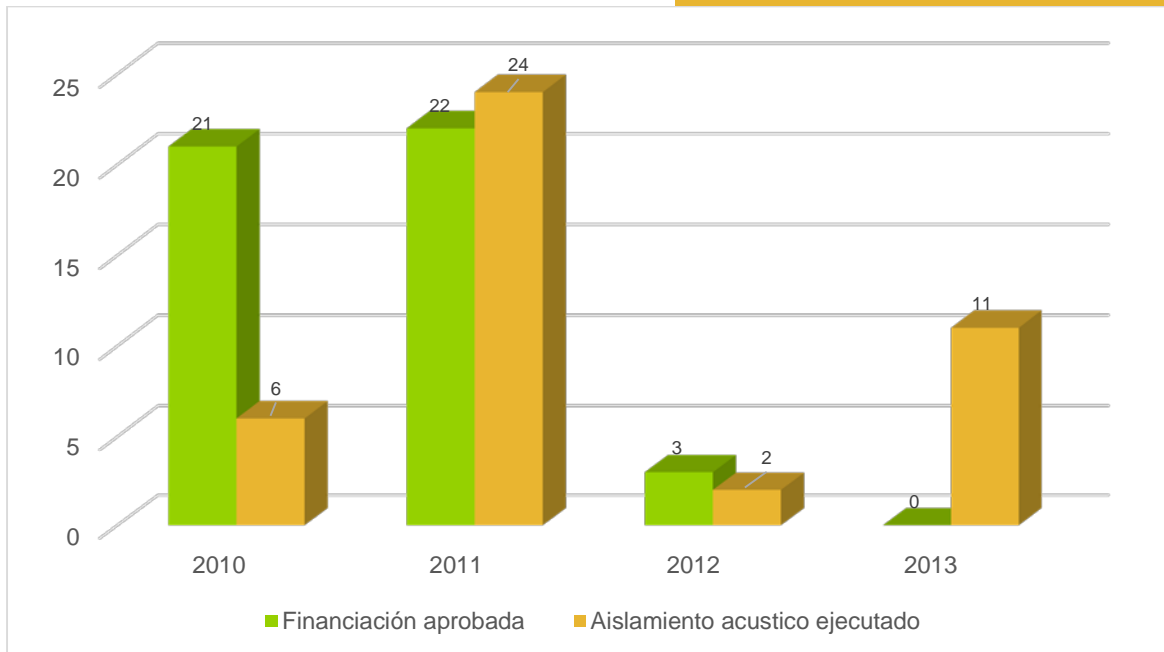

## Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2010-2013)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 1,16 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 1,06 Mill. €

