



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE A CORUÑA

Informe ejecutivo

11 de julio 2019

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

Declaración de Impacto Ambiental 17/09/10

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Culleredo	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1.943	1.943
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.601	1.601
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.586	1.586
Total de viviendas con medición efectuada	1.584	1.584
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	792	792
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	788	788
Total de viviendas con financiación aprobada	788	788
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	17	17
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	771	771

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:


$$R = \frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 788}{\text{Total solicitudes recibidas: } 1.601}$$

49,22 % DEL P.A.A. FINALIZADO

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2011-2019)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 788

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 771

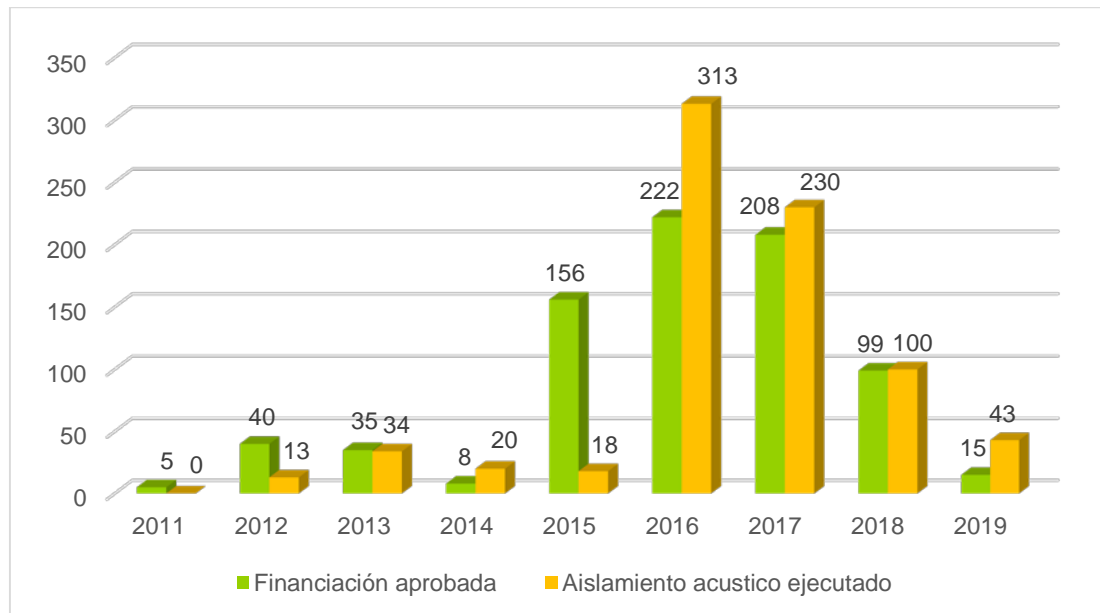

Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2011-2019)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 7.171 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 5.545 Mill. €

