



PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE VIGO

Informe ejecutivo

31 de diciembre de 2019

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

Declaración de Impacto Ambiental 03/12/09

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Mos	Redondela	Vigo	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	347	159	1	507
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	201	99	-	300
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	197	97	-	294
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	159	82	-	241
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	156	82	-	238
Total de viviendas con financiación aprobada	156	82	-	238
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	19	11	-	30
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	137	71	-	208

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

Declaración de Impacto Ambiental 03/12/09

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:


$$R = \frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 238}{\text{Total solicitudes recibidas: } 300}$$

79,33 % DEL P.A.A. FINALIZADO

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2012-2019)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 238

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 208

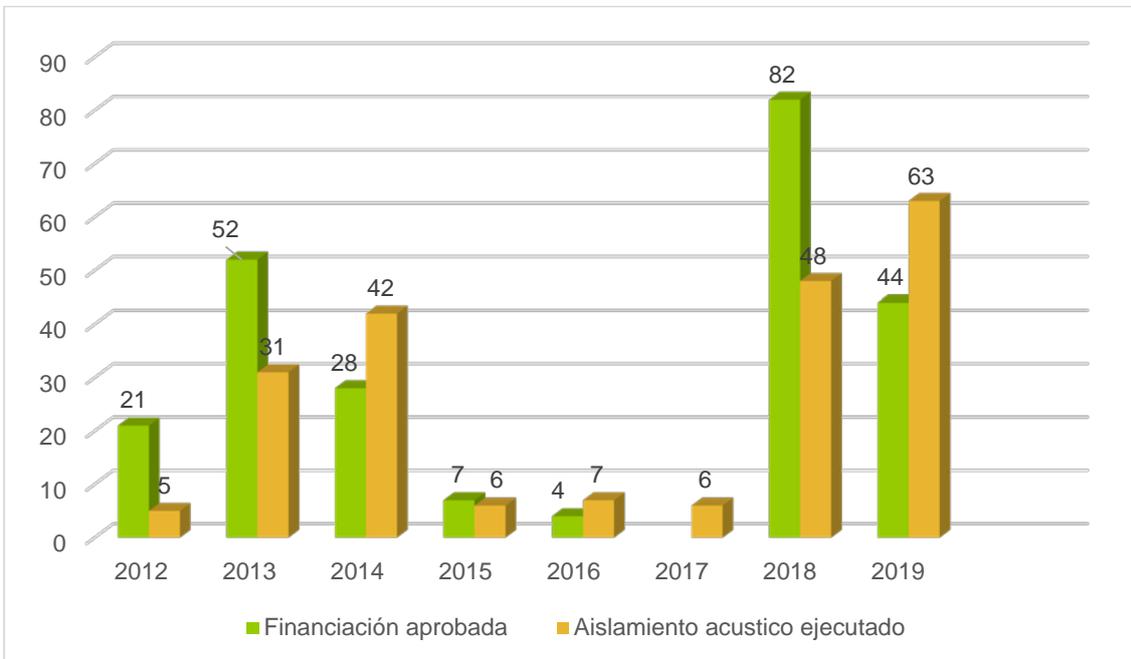

Importes aprobados y pagos efectuados en Mil. € (2009-2019)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 3.182 Mil. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 2.411 Mil. €

