



# PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CORRESPONDIENTE AL AEROPUERTO DE A CORUÑA

Informe ejecutivo

4 de diciembre 2019

## Gestión del Plan de Aislamiento Acústico

Declaración de Impacto Ambiental 17/09/10

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO	Culleredo	TOTAL
Censo de viviendas con derecho a solicitud de aislamiento acústico	1.943	<b>1.943</b>
Total de solicitudes recibidas para aislamiento acústico, en huella	1.603	<b>1.603</b>
Total de viviendas aprobadas para medición e informe	1.587	<b>1.587</b>
Total de viviendas con medición efectuada	1.584	<b>1.584</b>
Proyectos de aislamiento acústico solicitados	792	<b>792</b>
Proyectos presentados en la Oficina de Gestión del P.A.A.	791	<b>791</b>
Total de viviendas con financiación aprobada	790	<b>790</b>
Total de viviendas con aislamiento acústico en ejecución	18	18
Total de expedientes/viviendas con aislamiento acústico finalizado y pago efectuado	772	772

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio que define el grado de ejecución del PAA:


$$R = \frac{\text{Total de viviendas con financiación aprobada: } 790}{\text{Total solicitudes recibidas: } 1.603}$$

**49,28 % DEL P.A.A. FINALIZADO**

## Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2011-2019)

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA: 790

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO: 772

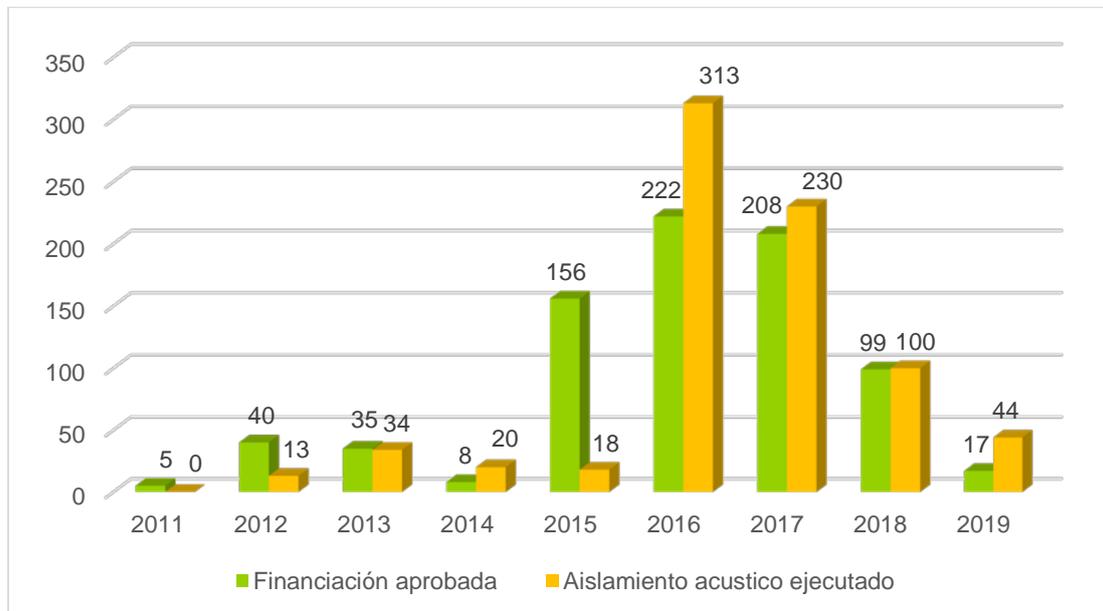

## Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2011-2019)

TOTAL IMPORTES APROBADOS: 7,19 Mill. €

TOTAL PAGOS EFECTUADOS: 6,08 Mill. €

